
# Мы управляем проектами

**Для этого у нас есть система совещаний трех уровней**

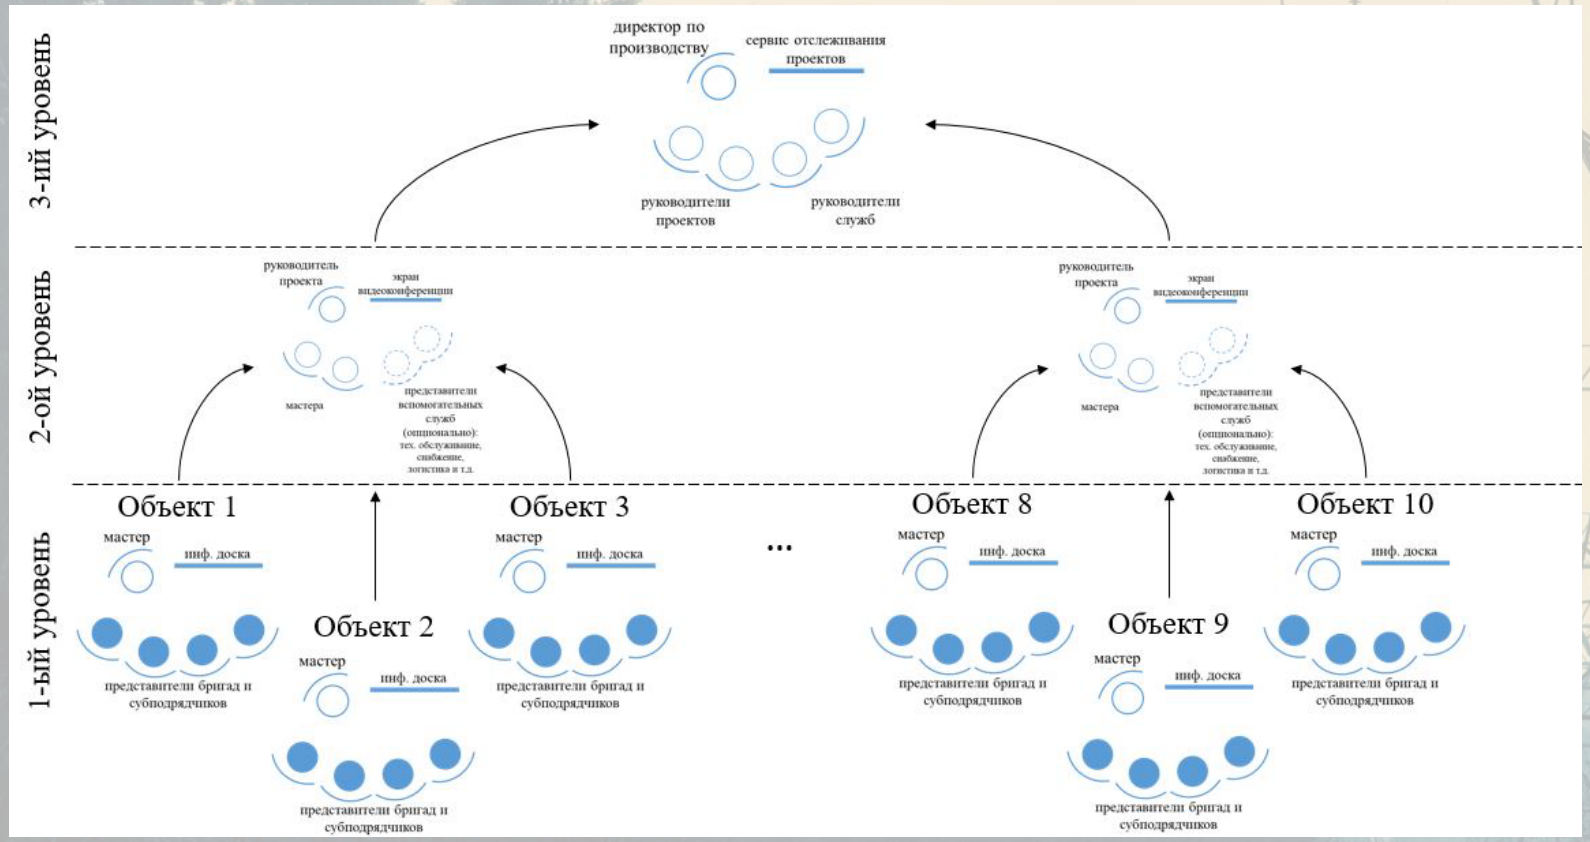



**1 день**

**срок эскалации барьеров от рабочего персонала до руководителя проекта**

**20 мин**

**требуется, чтобы получить полную картину по проекту и дать обратную связь**

# Мы управляем проектами

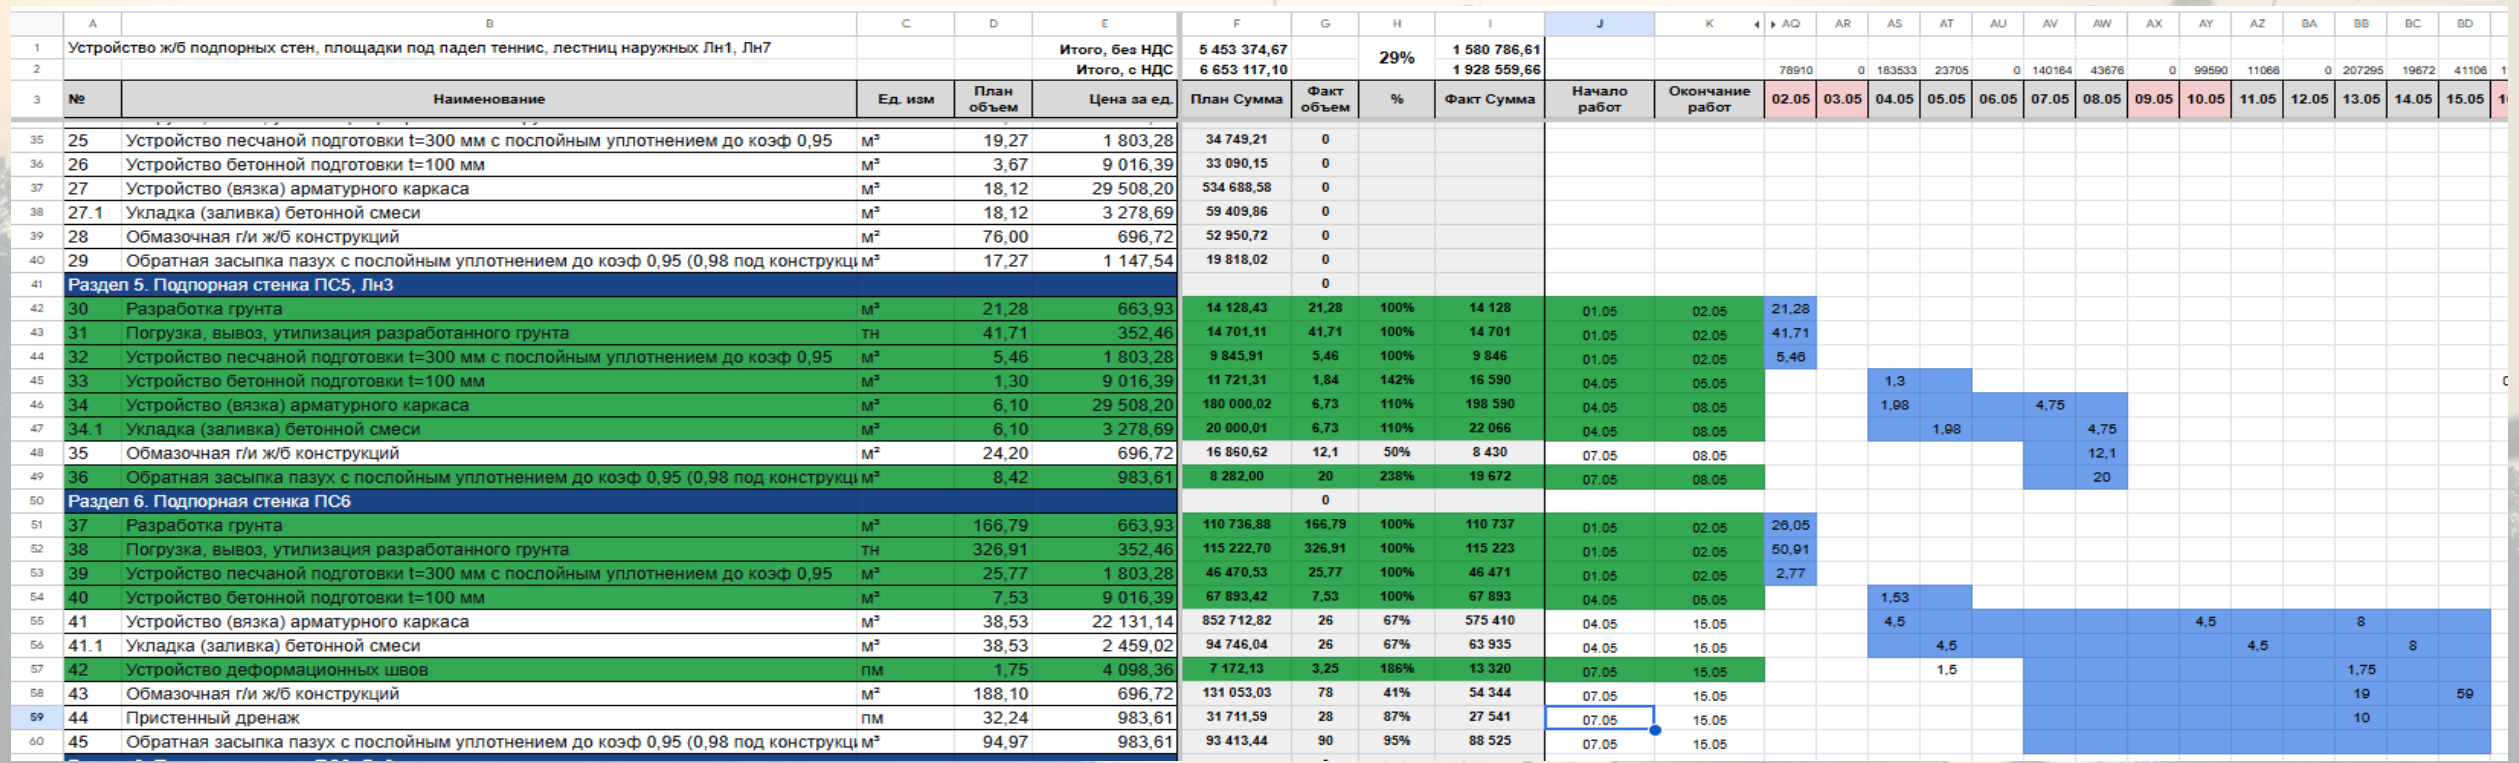

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устройство ж/б подпорных стен, площадки под падел теннис, лестниц наружных Лн1, Лн7 | | | | Итого, без НДС | 5 453 374,67 | | 29% | 1 580 786,61 | | | 78910 | 0 | 183533 | 23705 | 0 | 140164 | 43676 | 0 | 99590 | 11066 | 0 | 207295 | 19672 | 41106 |
| 2 | | | | | Итого, с НДС | 6 653 117,10 | | | 1 928 559,66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | № | Наименование | Ед. изм | План объем | Цена за ед. | План Сумма | Факт объем | % | Факт Сумма | Начало работ | Окончание работ | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 |
| 35 | 25 | Устройство песчаной подготовки t=300 мм с послойным уплотнением до коэф 0,95 | м³ | 19,27 | 1 803,28 | 34 749,21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 26 | Устройство бетонной подготовки t=100 мм | м³ | 3,67 | 9 016,39 | 33 090,15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 27 | Устройство (вязка) арматурного каркаса | м³ | 18,12 | 29 508,20 | 534 688,58 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 27.1 | Укладка (заливка) бетонной смеси | м³ | 18,12 | 3 278,69 | 59 409,86 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 28 | Обмазочная г/и ж/б конструкций | м² | 76,00 | 696,72 | 52 950,72 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 29 | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением до коэф 0,95 (0,98 под конструкци | м³ | 17,27 | 1 147,54 | 19 818,02 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Раздел 5. Подпорная стенка ПС5, Лн3 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 30 | Разработка грунта | м³ | 21,28 | 663,93 | 14 128,43 | 21,28 | 100% | 14 128 | 01.05 | 02.05 | 21,28 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 31 | Погрузка, вывоз, утилизация разработанного грунта | тн | 41,71 | 352,46 | 14 701,11 | 41,71 | 100% | 14 701 | 01.05 | 02.05 | 41,71 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 32 | Устройство песчаной подготовки t=300 мм с послойным уплотнением до коэф 0,95 | м³ | 5,46 | 1 803,28 | 9 845,91 | 5,46 | 100% | 9 846 | 01.05 | 02.05 | 5,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 33 | Устройство бетонной подготовки t=100 мм | м³ | 1,30 | 9 016,39 | 11 721,31 | 1,84 | 142% | 16 590 | 04.05 | 05.05 | | | 1,3 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 34 | Устройство (вязка) арматурного каркаса | м³ | 6,10 | 29 508,20 | 180 000,02 | 6,73 | 110% | 198 590 | 04.05 | 08.05 | | | 1,98 | | | 4,75 | | | | | | | | |
| 47 | 34.1 | Укладка (заливка) бетонной смеси | м³ | 6,10 | 3 278,69 | 20 000,01 | 6,73 | 110% | 22 066 | 04.05 | 08.05 | | | | 1,98 | | | 4,75 | | | | | | |
| 48 | 35 | Обмазочная г/и ж/б конструкций | м² | 24,20 | 696,72 | 16 860,62 | 12,1 | 50% | 8 430 | 07.05 | 08.05 | | | | | | | 12,1 | | | | | | | |
| 49 | 36 | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением до коэф 0,95 (0,98 под конструкци | м³ | 8,42 | 983,61 | 8 282,00 | 20 | 238% | 19 672 | 07.05 | 08.05 | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| 50 | Раздел 6. Подпорная стенка ПС6 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 37 | Разработка грунта | м³ | 166,79 | 663,93 | 110 736,88 | 166,79 | 100% | 110 737 | 01.05 | 02.05 | 26,05 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 38 | Погрузка, вывоз, утилизация разработанного грунта | тн | 326,91 | 352,46 | 115 222,70 | 326,91 | 100% | 115 223 | 01.05 | 02.05 | 50,91 | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 39 | Устройство песчаной подготовки t=300 мм с послойным уплотнением до коэф 0,95 | м³ | 25,77 | 1 803,28 | 46 470,53 | 25,77 | 100% | 46 471 | 01.05 | 02.05 | 2,77 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 40 | Устройство бетонной подготовки t=100 мм | м³ | 7,53 | 9 016,39 | 67 893,42 | 7,53 | 100% | 67 893 | 04.05 | 05.05 | | | 1,53 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 41 | Устройство (вязка) арматурного каркаса | м³ | 38,53 | 22 131,14 | 852 712,82 | 26 | 67% | 575 410 | 04.05 | 15.05 | | | 4,5 | | | | | | 4,5 | | | 8 | | |
| 56 | 41.1 | Укладка (заливка) бетонной смеси | м³ | 38,53 | 2 459,02 | 94 746,04 | 26 | 67% | 63 935 | 04.05 | 15.05 | | | | 4,5 | | | | | | 4,5 | | | 8 | |
| 57 | 42 | Устройство деформационных швов | пм | 1,75 | 4 098,36 | 7 172,13 | 3,25 | 186% | 13 320 | 07.05 | 15.05 | | | | 1,5 | | | | | | | | 1,75 | | |
| 58 | 43 | Обмазочная г/и ж/б конструкций | м² | 188,10 | 696,72 | 131 053,03 | 78 | 41% | 54 344 | 07.05 | 15.05 | | | | | | | | | | | | 19 | | 59 |
| 59 | 44 | Пристенный дренаж | пм | 32,24 | 983,61 | 31 711,59 | 28 | 87% | 27 541 | 07.05 | 15.05 | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 60 | 45 | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением до коэф 0,95 (0,98 под конструкци | м³ | 94,97 | 983,61 | 93 413,44 | 90 | 95% | 88 525 | 07.05 | 15.05 | | | | | | | | | | | | | | |

**Держим все сметы в одном месте**

**Планируем очередность и сроки работ**

**Отслеживаем факт выполненных работ**

# Мы управляем проектами


| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Устройство ж/б подпорных стен, площадки под падел теннис, лестниц наружн | | | | Итого, без НДС | 2 671 565,381 | | | | | 1 086 557,86 | | | | | |
| 2 | | | | | Итого, с НДС | 3 259 309,765 | | | | | 1 325 600,58 | | | | | |
| 3 | № | Обоснование | Наименование работ и затрат | д. изм | п-во смет | Цена за ед. без НДС | Стоимость без НДС сметная | Поставщик | Фактическое наименование | Кол-во поставщика | Цена поставщика без НДС за ед | Стоимость без НДС поставщика | Договор с Поставщиком | Оплата | Статус изделия | Срок поставки |
| 50 | 47 | 42 | песок карьерный | м³ | 6,010 | 598,4 | 3 596,38 | ИП Ширяев | Песок природный | 6,01 | 1 402,50 | 8 429,03 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 08.05.2026 |
| 51 | 48 | 43 | бетон В7,5 | м³ | 1,330 | 9 016,4 | 11 991,81 | ООО Бетонный завод "Салют | Бетон В 7,5 П4 F50 W2 ГОСТ 7473-2010 | 1,21 | 3 483,61 | 4 215,16 | На рассмотрении | Оплачено | Доставлен | 04.05.2026 |
| 52 | 49 | 44 | пленка п/э 0,2 мм | м² | 14,300 | 57,4 | 820,82 | ООО "Ле Монлид" | Пленка техническая MONLID 200мкм 2х10 м | 14,3 | 24,36 | 348,31 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 23.04.2026 |
| 53 | 50 | 45 | бетон В25 F200 W6 | м³ | 6,190 | 8 196,7 | 50 737,57 | ООО Бетонный завод "Салют | БСТ В25 П4 F200 W6 ГОСТ 7473-2010 | 6,73 | 5 737,70 | 38 614,75 | На рассмотрении | Не оплачено | Доставлен | 07.05.2026 |
| 54 | 51 | 46 | бетон В25 F200 W6 | м³ | 1,420 | 8 196,7 | 11 639,31 | ООО Бетонный завод "Салют | БСТ В25 П4 F200 W6 ГОСТ 7473-2010 | 2 | 5 737,70 | 11 475,41 | На рассмотрении | Оплачено | Доставлен | 20.05.2026 |
| 55 | 52 | 47 | арматура ф8 А240 | тн | 0,080 | 57 377,0 | 4 590,16 | ООО "Металлсервис-Москва" | Арматура класс А1(240) ГОСТ 2781/34028 8 дл 6м | 0,08 | 44 827,87 | 3 586,23 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 27.04.2026 |
| 56 | 53 | 48 | арматура ф12 А500С | тн | 0,760 | 49 180,3 | 37 377,03 | ООО "Металлсервис-Москва" | Арматура класс А3 ГОСТ 34028 А500С 12 дл 11,7 м | 0,76 | 39 336,07 | 29 895,41 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 27.04.2026 |
| 57 | 54 | 49 | праймер битумный | л | 3,870 | 286,9 | 1 110,30 | ООО "Сатурн Самара" | ТЕХНОНИКОЛЬ АкваМаст праймер битумный (16кг) | 3,87 | 131,13 | 507,47 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 08.05.2026 |
| 58 | 55 | 50 | мастика битумная | кг | 58,080 | 426,2 | 24 753,70 | ООО "Сатурн Самара" | ТЕХНОНИКОЛЬ АкваМаст мастика битумная | 58,08 | 132,89 | 7 718,19 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 08.05.2026 |
| 59 | 56 | 51 | местный непучинистый непросадочный грунт из | м³ | 9,260 | 598,4 | 5 541,18 | ИП Ширяев | Песок природный | 9,26 | 1 402,50 | 12 987,15 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 09.05.2026 |
| 60 | 57 | Раздел 6. Подпорная стенка ПС6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 58 | 52 | песок карьерный | м³ | 28,340 | 598,4 | 16 958,66 | ООО "ССР" | Песок природный | 28,34 | 553,28 | 15 679,92 | На рассмотрении | Оплачено | Доставлен | 25.04.2026 |
| 62 | 59 | 53 | бетон В7,5 | м³ | 7,680 | 4 918,0 | 37 770,24 | ООО Бетонный завод "Салют | Бетон В 7,5 П4 F50 W2 ГОСТ 7473-2010 | 7,68 | 3 483,61 | 26 754,10 | На рассмотрении | Оплачено | Доставлен | 04.05.2026 |
| 63 | 60 | 54 | пленка п/э 0,2 мм | м² | 82,830 | 57,4 | 4 754,44 | ООО "Ле Монлид" | Пленка техническая MONLID 200мкм 2х10 м | 82,83 | 24,36 | 2 017,52 | Подписан | Оплачено | Доставлен | 23.04.2026 |

**Планируем закупку материалов**

**Контролируем сроки изготовления**

**Обеспечиваем доставку**

# Мы управляем проектами

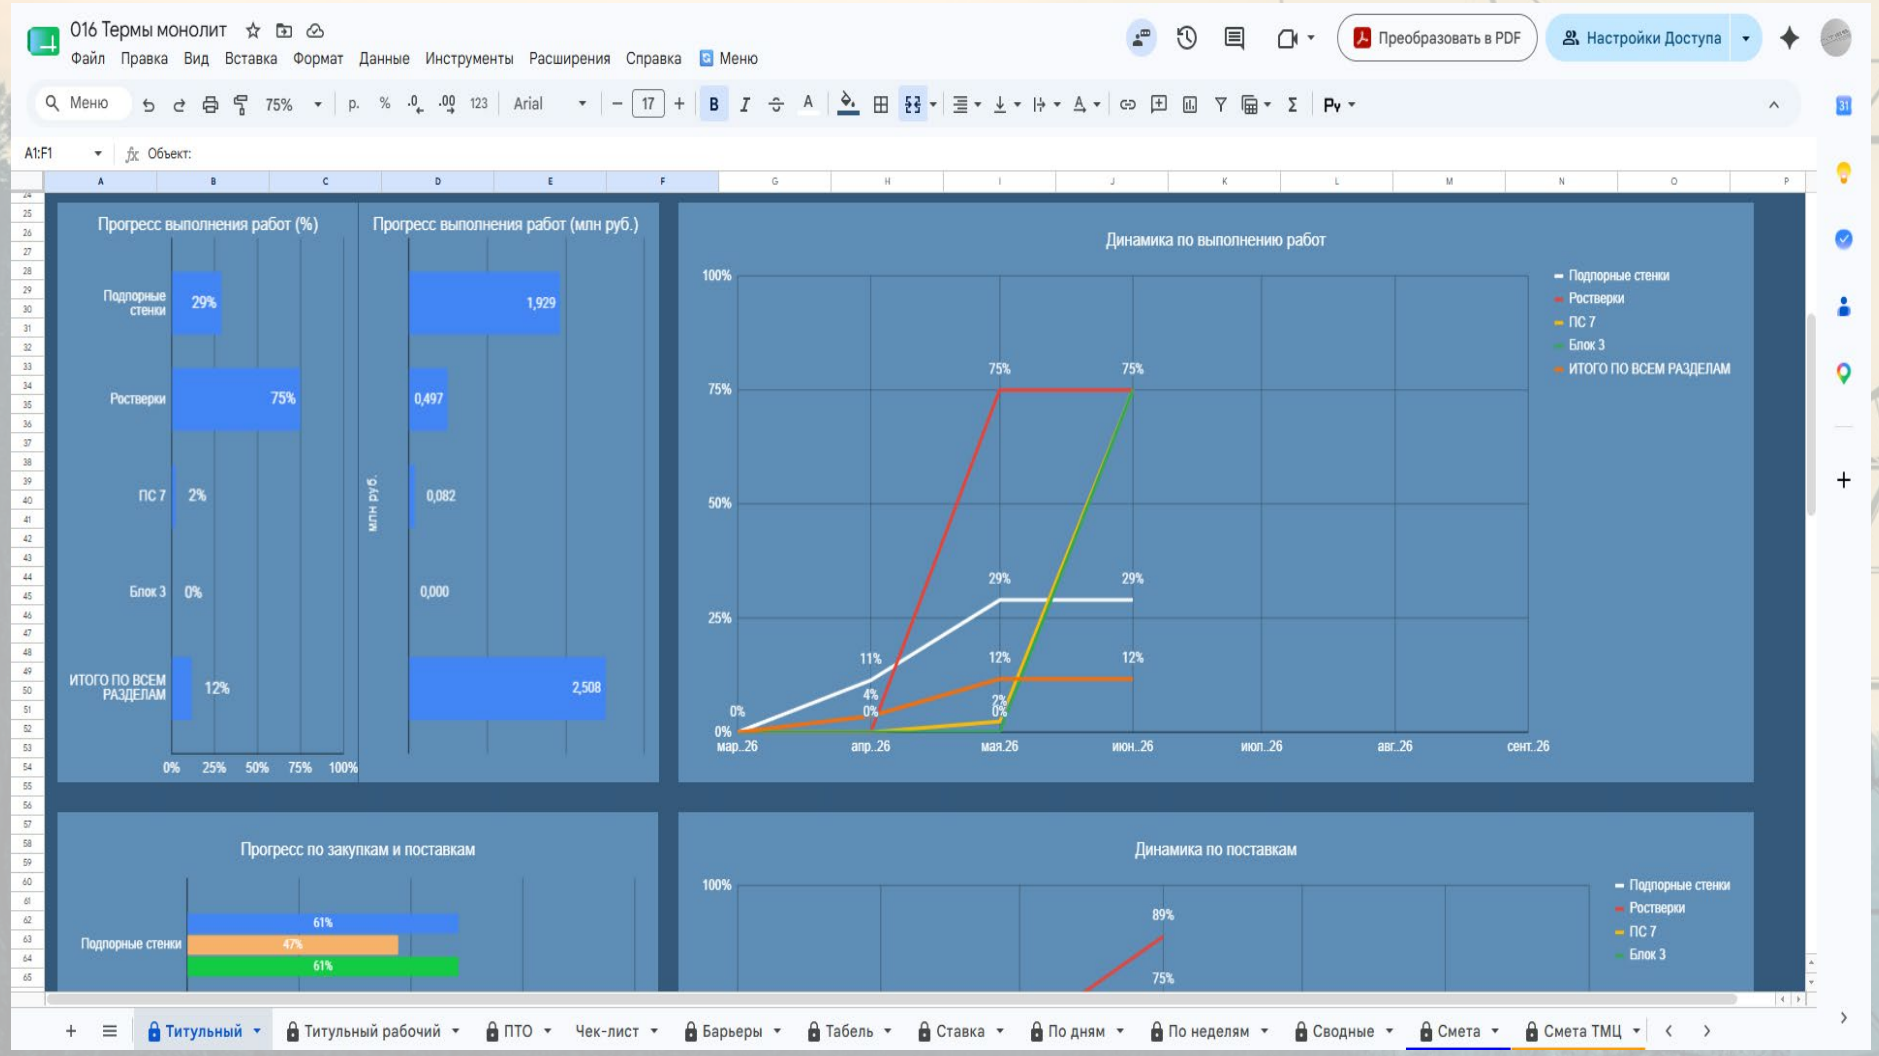



**Контролируем прогресс**

**Своевременно выявляем и устраняем барьеры**

# Мы управляем проектами

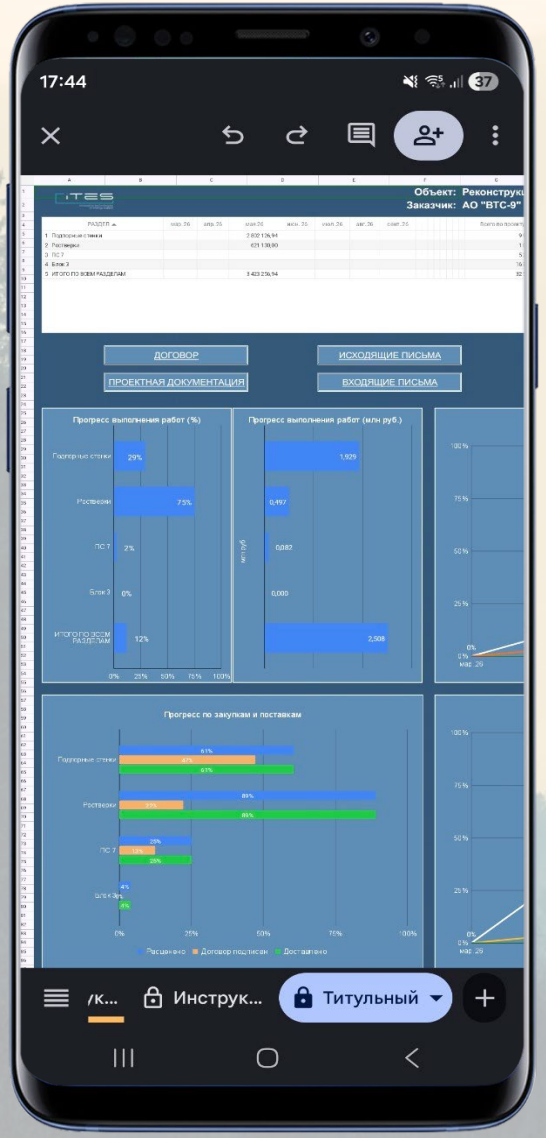


**С помощью облачного инструмента мы соединяем строительные объекты с офисом**

**Данные передаются в два клика со смартфона, планшета, ПК и доступны в любой точке мира**

**Telegram-бот с ежедневными отчётами по работам и отклонениям**
